b.o.x. architekten gmbh
Wasserstrasse 28 2502 Biel/Bienne Fon 032 345 17 77 Fax 032 345 17 78

www.box-architekten.ch
mail@box-architekten.ch

1206 Diessbach Etappe 2

Bauprogramm

28. Mai 2014

	Aktivitätsname	Unternehmer	Dauer	Startdatum
1	**Hoschtet (H) Baustart**		**0.00**	**24.2.2014**
2	**Kornfeld (K) Baustart**		**0.00**	**17.2.2014**
3	**Vorhaltezeit Gerüst H**		**96.00**	**18.3.2014**
4	211.1 Gerüstungen H	Gatti	3.00	18.3.2014
5	211.1 Gerüstungen H Abbau	Gatti	2.00	28.7.2014
6	**Vorhaltezeit Gerüst K**		**115.00**	**18.3.2014**
7	211.1 Gerüstungen K	Gatti	4.00	18.3.2014
8	211.1 Gerüstungen K Abbau	Gatti	3.00	21.8.2014
9	**2 Gebäude**		**212.00**	**17.2.2014**
10	**20 Baugrube...**		**9.00**	**17.2.2014**
13	**21 Rohbau 1**		**118.00**	**24.2.2014**
14	**211 Baumeisterarbeiten**		**108.00**	**24.2.2014**
15	211.3 Baumeisteraushub...		**10.00**	**24.2.2014**
22	211.5 Beton- und Stahlbetonarbeiten H...			**10.3.2014**
32	211.5 Beton- und Stahlbetonarbeiten K...		**59.00**	**7.3.2014**
43	211.5 Beton- und Stahlbetonarbeiten U		**25.00**	**19.6.2014**
44	Carport	GebrJetzer	15.00	19.6.2014
45	Stützmauer	GebrJetzer	10.00	10.7.2014
46	Reserve	GebrJetzer	0.00	24.7.2014
47	211.6 Maurerarbeiten H		**64.00**	**18.3.2014**
48	Wände UG	GebrJetzer	4.00	18.3.2014
49	Wände EG	GebrJetzer	4.00	1.4.2014
50	Wände OG	GebrJetzer	4.00	11.4.2014
51	Wände DG	GebrJetzer	4.00	23.4.2014
52	Reserve/Verzug	GebrJetzer	34.00	29.4.2014
53	211.6 Maurerarbeiten K		**74.00**	**18.3.2014**
54	Wände UG	GebrJetzer	5.00	18.3.2014
55	Wände EG	GebrJetzer	5.00	3.4.2014
56	Wände OG	GebrJetzer	5.00	17.4.2014
57	Wände DG	GebrJetzer	5.00	1.5.2014
58	Reserve/Verzug	GebrJetzer	37.00	8.5.2014
59	212.2 Elemente in Beton H...		**10.00**	**1.4.2014**
62	212.2 Elemente in Beton K...		**12.00**	**3.4.2014**
65	212.2 Elemente in Beton U		**3.00**	**16.6.2014**
66	Fluchtröhre	Creabeton	3.00	16.6.2014
67	**214 Montagebau in Holz**		**38.00**	**16.6.2014**
68	214.4 Äussere Verkleidungen, Gesimse H	Moosmann	12.00	30.6.2014
69	214.4 Äussere Verkleidungen, Gesimse K	Moosmann	16.00	16.7.2014
70	214.6 Steildächer, Hoschtet	Moosmann	6.00	16.6.2014
71	214.6 Steildächer, Kornfeld	Moosmann	7.00	30.6.2014
72	**22 Rohbau 2**		**48.00**	**16.6.2014**
73	**221 Fenster, Aussentüren, Tore**		**22.00**	**16.6.2014**
74	221 Fenster, Aussentüren, Tore H	Balex	10.00	16.6.2014
75	221 Fenster, Aussentüren, Tore K	Balex	12.00	30.6.2014
76	**222 Spenglerarbeiten**		**16.00**	**24.6.2014**
77	222 Spenglerarbeiten H	Sigi	4.00	24.6.2014
78	222 Spenglerarbeiten K	Sigi	5.00	9.7.2014
79	**224 Bedachungsarbeiten**		**22.00**	**30.6.2014**
80	224 Bedachungsarbeiten H	Sigi	8.00	30.6.2014
81	224 Bedachungsarbeiten K	Sigi	10.00	16.7.2014
82	**226 Fassadenputze**		**17.00**	**16.6.2014**
83	226 Fassadenputze H (Sockel)	Egli	6.00	16.6.2014
84	226 Fassadenputze K (Sockel)	Egli	7.00	30.6.2014
85	**228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz**		**26.00**	**16.7.2014**
86	228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz H	Storama	8.00	16.7.2014
87	228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz K	Storama	10.00	7.8.2014
88	**23 Elektroanlagen**		**108.00**	**2.7.2014**
89	232/236 Stark-/Schwachstrominstallationen		**108.00**	**2.7.2014**
90	232/236 Verrohrung/Verkabelung H	Gutjahr	12.00	2.7.2014
91	232/236 Endmontage H	Gutjahr	12.00	10.10.2014
92	232/236 Verrohrung/Verkabelung K	Gutjahr	15.00	21.7.2014
93	232/236 Endmontage K	Gutjahr	15.00	10.11.2014
94	**24 Heizungs-, Lüftungs-, Klimaanlagen**		**50.00**	**30.6.2014**
95	242 Wärmeerzeugung		**27.00**	**30.6.2014**
96	242 Wärmeerzeugung H	Burri	12.00	30.6.2014
97	242 Wärmeerzeugung K	Burri	15.00	16.7.2014
98	243 Wärmeverteilung		**48.00**	**2.7.2014**
99	243 Verrohrung/UV H	Burri	12.00	2.7.2014
100	243 Verrohrung/UV K	Burri	15.00	23.7.2014
101	243 Fussbodenheitung H	Burri	12.00	24.7.2014

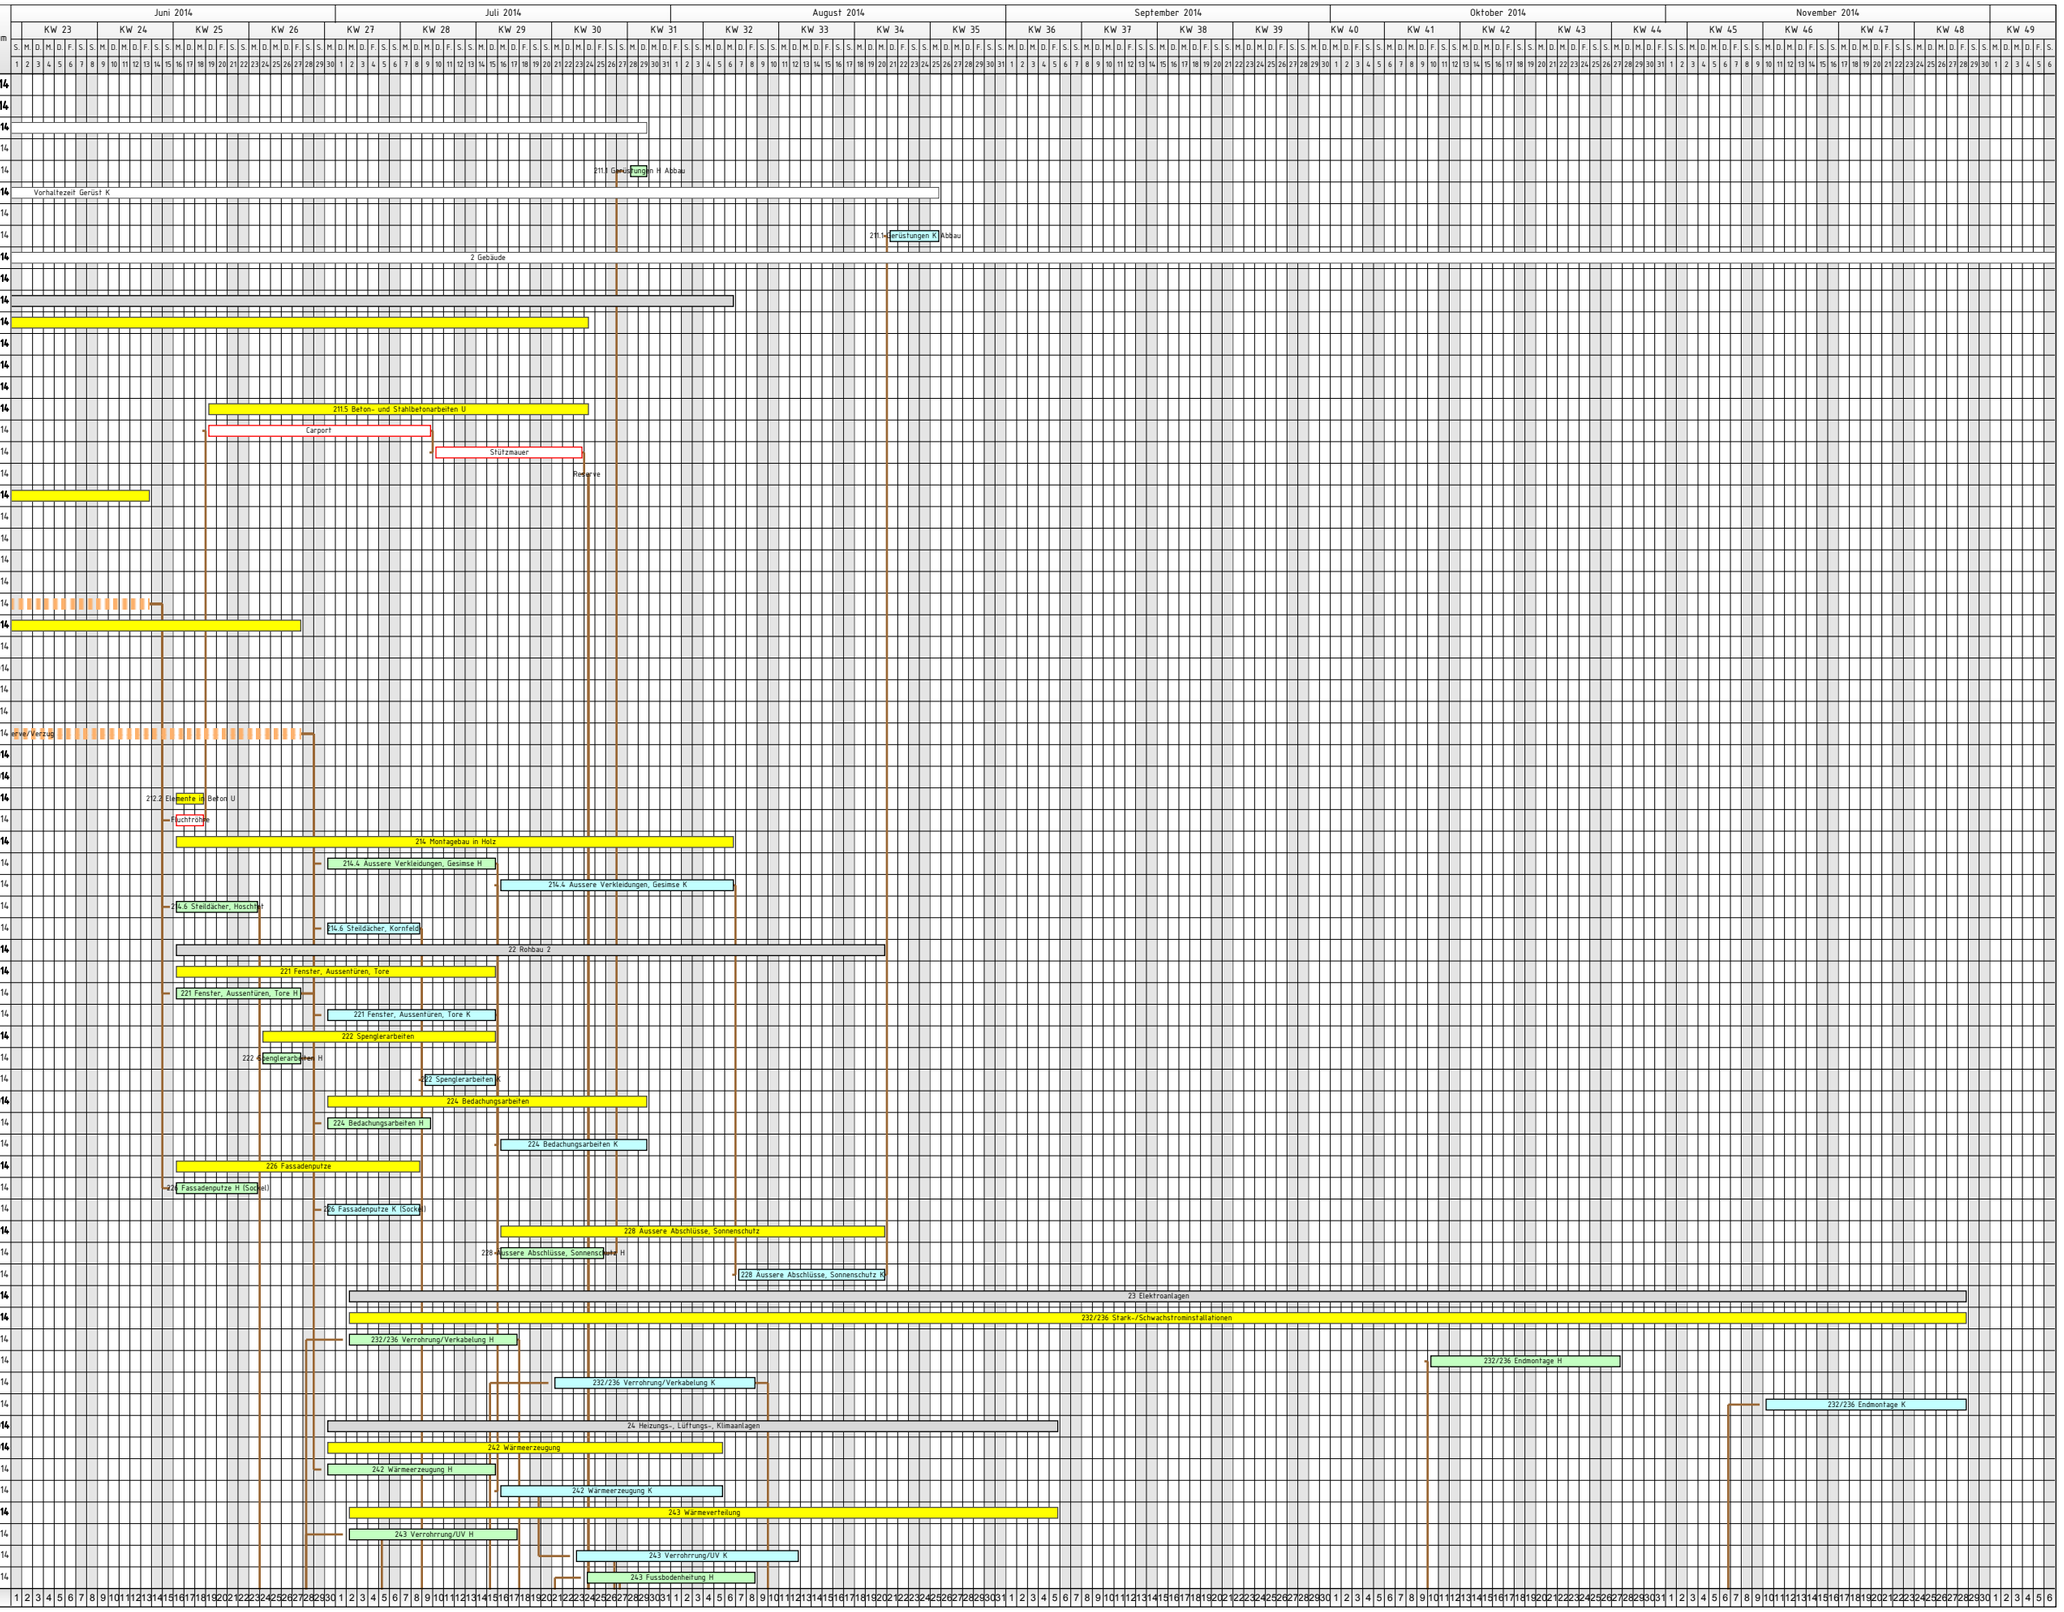

b.o.x. architekten gmbh
Wasserstrasse 28 2502 Biel/Bienne Fon 032 345 17 77 Fax 032 345 17 78

www.box-architekten.ch
mail@box-architekten.ch

1206 Diessbach Etappe 2

Bauprogramm

28. Mai 2014
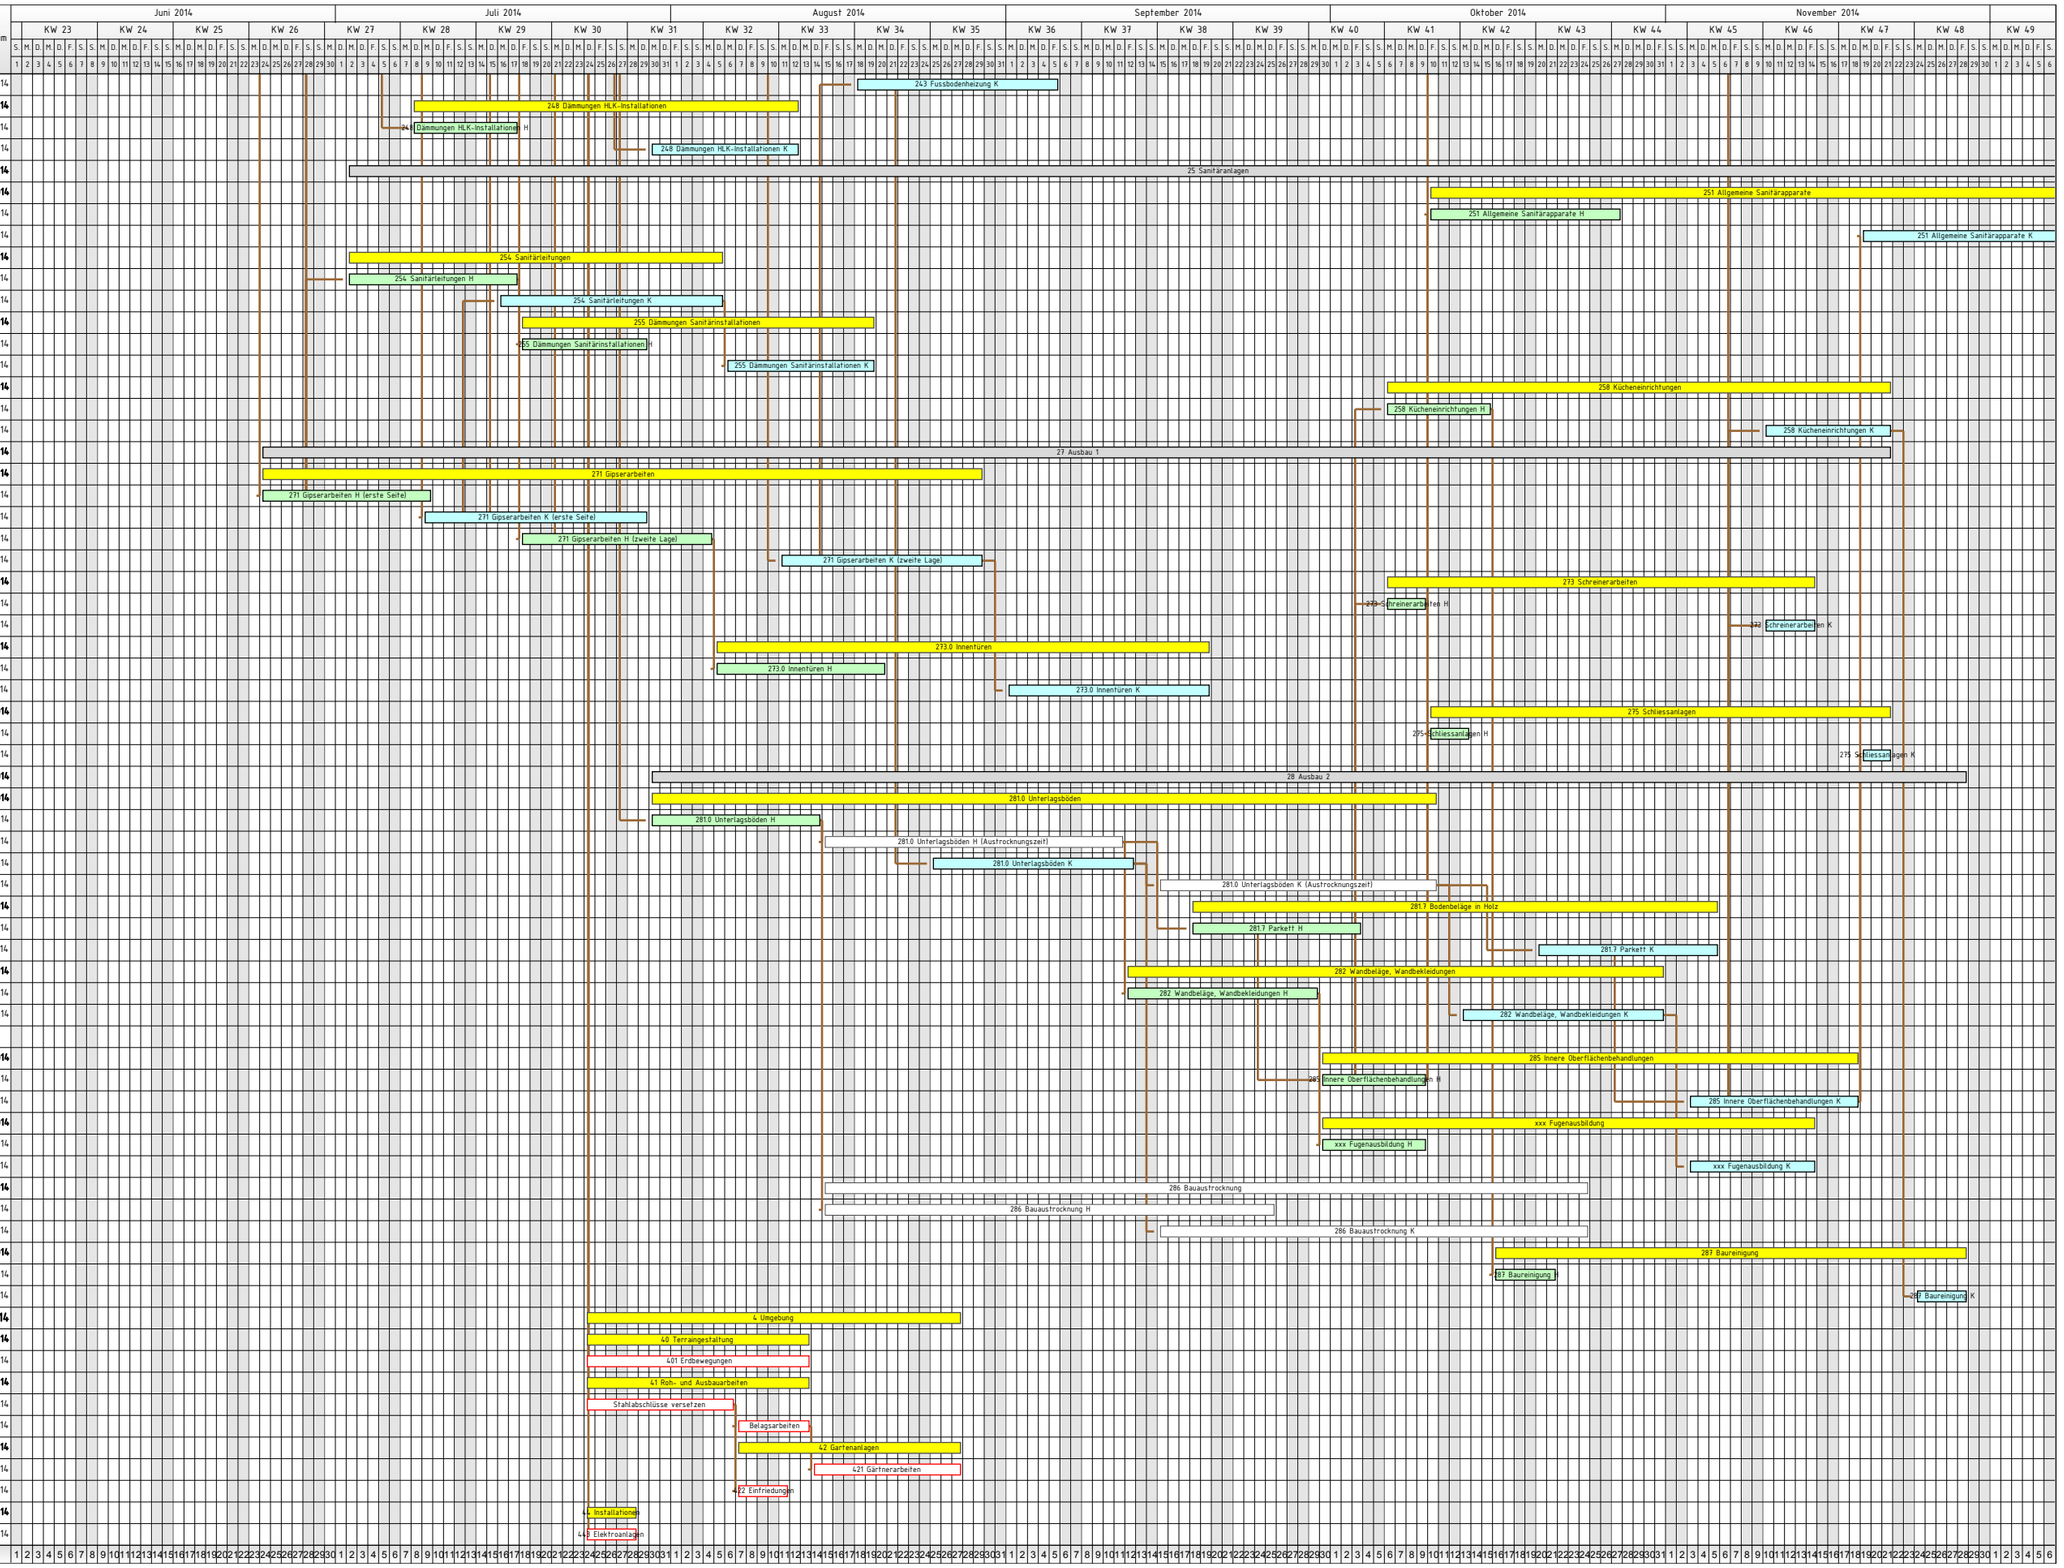
	Aktivitätsname	Unternehmer	Dauer	Startdatum
102	243 Fussbodenheizung K	Burri	15.00	18.8.2014
103	248 Dämmungen HLK-Installationen		**26.00**	**8.7.2014**
104	248 Dämmungen HLK-Installationen H	Burri	8.00	8.7.2014
105	248 Dämmungen HLK-Installationen K	Burri	10.00	30.7.2014
106	**25 Sanitäranlagen**		**115.00**	**2.7.2014**
107	251 Allgemeine Sanitärapparate		**43.00**	**10.10.2014**
108	251 Allgemeine Sanitärapparate H	Burri	12.00	10.10.2014
109	251 Allgemeine Sanitärapparate K	Burri	15.00	19.11.2014
110	254 Sanitärleitungen		**25.00**	**2.7.2014**
111	254 Sanitärleitungen H	Burri	12.00	2.7.2014
112	254 Sanitärleitungen K	Burri	15.00	16.7.2014
113	255 Dämmungen Sanitärinstallationen		**23.00**	**18.7.2014**
114	255 Dämmungen Sanitärinstallationen H	Burri	8.00	18.7.2014
115	255 Dämmungen Sanitärinstallationen K	Burri	10.00	6.8.2014
116	**258 Kücheneinrichtungen**		**35.00**	**6.10.2014**
117	258 Kücheneinrichtungen H	Sanitas	8.00	6.10.2014
118	258 Kücheneinrichtungen K	Sanitas	10.00	10.11.2014
119	**27 Ausbau 1**		**109.00**	**24.6.2014**
120	271 Gipserarbeiten		**49.00**	**24.6.2014**
121	271 Gipserarbeiten H (erste Seite)	Egli	12.00	24.6.2014
122	271 Gipserarbeiten K (erste Seite)	Egli	15.00	9.7.2014
123	271 Gipserarbeiten H (zweite Lage)	Egli	12.00	18.7.2014
124	271 Gipserarbeiten K (zweite Lage)	Egli	15.00	11.8.2014
125	273 Schreinerarbeiten		**30.00**	**6.10.2014**
126	273 Schreinerarbeiten H	Sanitas	4.00	6.10.2014
127	273 Schreinerarbeiten K	Sanitas	5.00	10.11.2014
128	273.0 Innentüren		**34.00**	**5.8.2014**
129	273.0 Innentüren H	Egli	12.00	5.8.2014
130	273.0 Innentüren K	Egli	15.00	1.9.2014
131	275 Schliessanlagen		**31.00**	**10.10.2014**
132	275 Schliessanlagen H	???	2.00	10.10.2014
133	275 Schliessanlagen K	???	3.00	19.11.2014
134	**28 Ausbau 2**		**88.00**	**30.7.2014**
135	281.0 Unterlagsböden		**53.00**	**30.7.2014**
136	281.0 Unterlagsböden H	B+L	12.00	30.7.2014
137	281.0 Unterlagsböden H (Austrocknungszeit)	B+L	20.00	15.8.2014
138	281.0 Unterlagsböden K	B+L	15.00	25.8.2014
139	281.0 Unterlagsböden K (Austrocknungszeit)	B+L	20.00	15.9.2014
140	281.7 Bodenbeläge in Holz		**35.00**	**18.9.2014**
141	281.7 Parkett H	Brodbeck	12.00	18.9.2014
142	281.7 Parkett K	Brodbeck	13.00	20.10.2014
143	282 Wandbeläge, Wandbekleidungen		**36.00**	**12.9.2014**
144	282 Wandbeläge, Wandbekleidungen H	Friedli	12.00	12.9.2014
145	282 Wandbeläge, Wandbekleidungen K	Friedli	15.00	13.10.2014
146	284 Hafnerarbeiten OPTIONAL			
147	285 Innere Oberflächenbehandlungen		**36.00**	**30.9.2014**
148	285 Innere Oberflächenbehandlungen H	Egli	8.00	30.9.2014
149	285 Innere Oberflächenbehandlungen K	Egli	12.00	3.11.2014
150	xxx Fugenausbildung		**34.00**	**30.9.2014**
151	xxx Fugenausbildung H	Egli	8.00	30.9.2014
152	xxx Fugenausbildung K	Egli	10.00	3.11.2014
153	286 Bauaustrocknung		**51.00**	**15.8.2014**
154	286 Bauaustrocknung H		30.00	15.8.2014
155	286 Bauaustrocknung K		30.00	15.9.2014
156	287 Baureinigung		**32.00**	**16.10.2014**
157	287 Baureinigung H		4.00	16.10.2014
158	287 Baureinigung K		5.00	24.11.2014
159	**4 Umgebung**		**25.00**	**24.7.2014**
160	40 Terraingestaltung		**15.00**	**24.7.2014**
161	401 Erdbewegungen	Aemmer	15.00	24.7.2014
162	41 Roh- und Ausbauarbeiten		**15.00**	**24.7.2014**
163	Stahlabschlüsse versetzen	Aemmer	10.00	24.7.2014
164	Belagsarbeiten	Aemmer	5.00	7.8.2014
165	42 Gartenanlagen		**15.00**	**7.8.2014**
166	421 Gärtnerarbeiten	Aemmer	10.00	14.8.2014
167	422 Einfriedungen	Aemmer	3.00	7.8.2014
168	44 Installationen		**3.00**	**24.7.2014**
169	443 Elektroanlagen	Gutjahr	3.00	24.7.2014
